


## PLAN DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE DE LA ISLA DE EL HIERRO: MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA Nº 47 Y 48, Y MONTE CONSORCIADO LOS COLGADOS DE BINTO

### EVALUACIÓN DEL ESTADO DE IMPLANTACIÓN. ENERO 2021.

En cumplimiento de la *Estrategia de la UE en favor de los bosques y el sector forestal*, de la *Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes*, así como del *Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2014-2020*, la isla de El Hierro se dotó de un **Plan de Gestión Forestal Sostenible**. Esta herramienta de gestión afecta a sus dos Montes de Utilidad Pública (nº 47, *Pinar de San Salvador*; nº 48, *Pinar de Los Reyes*), así como al monte consorciado conocido como Los Colgados de Binto. Aprobado por el Cabildo Insular en **2018**, este Plan ha permitido evaluar, definir y programar en el tiempo las actuaciones necesarias para la mejor gestión de los montes de nuestra isla en el período **2017-2032**. Con fecha de enero de 2022, se ha realizado la correspondiente evaluación del desarrollo de la implantación del mismo, cuyos resultados aquí se exponen.

### Actuaciones iniciadas

De las 42 acciones proyectadas para el período de **15 años** establecido, ya se han iniciado 20, un **48%** de las mismas. De todas ellas, 5 han concluido ya, un 12 % de las establecidas.

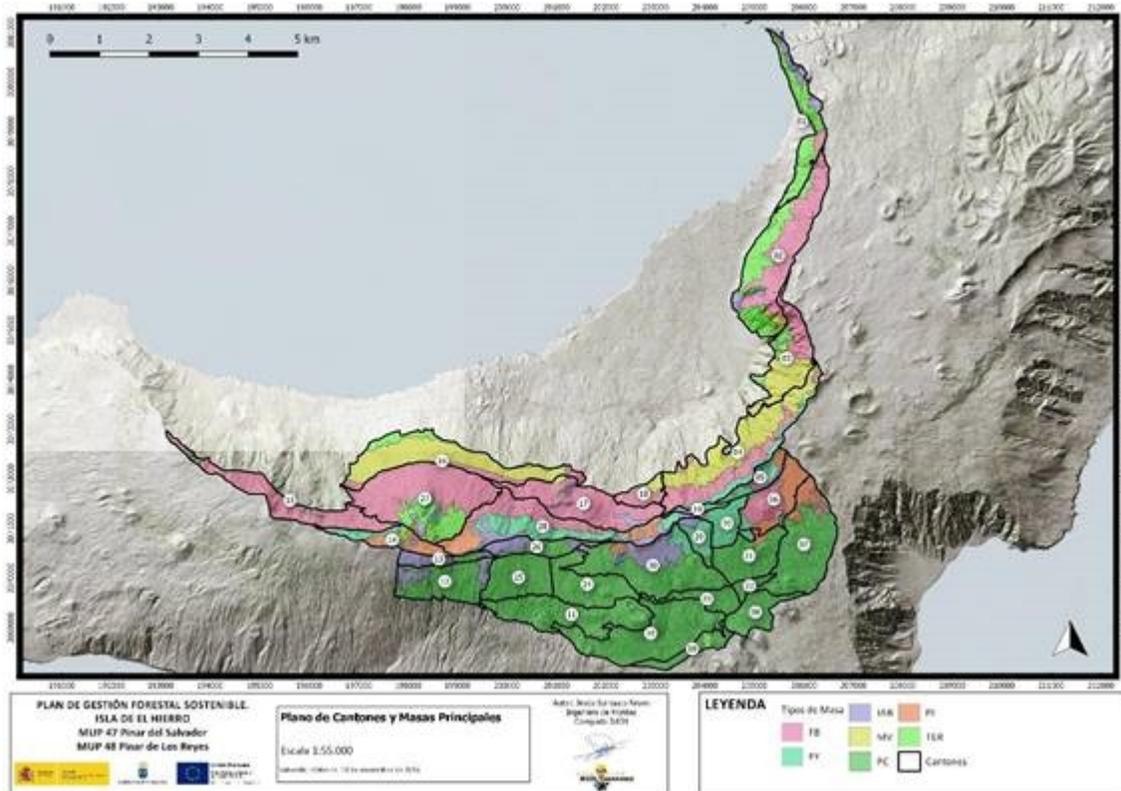

### Presupuesto ejecutado

En total, se han ejecutado actuaciones por un total de **1.298.739,25 €**, frente al presupuesto base previsto de **4.831.089,50 €**. Esto representa una ejecución del **27%** del importe, por delante de las previsiones. En el anterior informe se había estimado un 20% de implantación en términos económicos, que ha sido, por tanto, superado.

Se estima que, al finalizar el presente ejercicio, 2022, se habrá alcanzado el 31% de implantación en términos económicos.

Código	Prioridad	Periodo programado	Periodo Modificado	Periodo de ejecución	Presupuesto Inicial	Presupuesto definitivo	Comentarios	Financiación	% Cumplimiento	Iniciado	Completado
CON-01	1	Anual	Anual		36.000,00 €		Reintroducción Lagarto		27%	●	○
CON-02	1	Anual	Anual		37.500,00 €		Dornajos		0%	○	○
PUB-02	1	Anual	Anual		402.405,30 €		Mantenimiento Morcillo		33%	●	○
PUB-03	1	Anual	Anual		1.027.164,00 €		Recepción visitantes Morcillo		33%	●	○
PUB-04	1	Anual	Anual		187.820,55 €		Mantenimiento Hoya del Pino		33%	●	○
PUB-05	1	2021	2021		119.000,00 €		Mejora Hoya del Morcillo		0%	○	○
CON-01	1	Anual	Anual		82.500,00 €		Dornajos		0%	○	○
DES-01	1	2018	2021		159.465,12 €		Deslinde		0%	○	○
PUB-01	2	2018	2022		12.900,00 €		Barreras pistas		0%	○	○
EYP-04	1	2020	2020		530.000,00 €		Autobombas		100%	●	●
EYP-02	1	2018	2018		6.000,00 €		Autoprotección Morcillo		100%	●	●
EYP-05	1	2021	2021		3.000,00 €		Plan de Aprovechamientos		100%	●	●
MEJ-02	1	2018	2022		34.208,66 €				0%	○	○
DES-01	1	2018	2022		23.087,12 €		Deslinde		0%	○	○
PUB-01	2	2018-19	2024-25		2.150,00 €		Barreras pistas		0%	○	○
MEJ-13	1	2020	2023		15.860,68 €				0%	○	○
MEJ-01	1	2029	2029		123.796,76 €		Adelantar en tiempo		20%	●	○
MEJ-05	3	2030	2030		28.803,91 €				20%	●	○
MEJ-02	1	2019	2030		118.930,53 €				0%	○	○
EYP-03	1	2019	2024		2.500,00 €		Autoprotección Hoya del Pino		0%	○	○
MEJ-10	2	2019	2025		19.730,91 €				25%	●	○
MEJ-06	2	2029	2025		28.353,38 €				0%	○	○
MEJ-01	2	2021	2025		251.132,79 €				25%	●	○
MEJ-07	2	2025	2026		25.811,50 €				10%	●	○
MEJ-12	2	2028	2026		53.014,67 €				0%	○	○
MEJ-08	2	2019	2027		89.666,82 €				25%	●	○
MEJ-09	1	2027	2028		45.185,10 €				25%	●	○
MEJ-03	2	2022	2028		76.666,38 €				0%	○	○
MEJ-14	2	2031-2	2028		508.079,90 €				0%	○	○
MEJ-16	2	2022	2028		23.200,69 €				100%	●	●
MEJ-17	2	2022	2029		18.648,33 €				100%	●	●
MEJ-18	2	2022	2029		23.513,76 €				0%	○	○
MEJ-19	2	2022	2026		14.663,87 €				50%	●	○
MEJ-20	2	2022	2026		33.679,67 €				0%	○	○
MEJ-22	2	2026	2027		56.206,57 €				50%	●	○
MEJ-23	2	2027	2027		16.586,84 €				0%	○	○
MEJ-25	2	2027	2027		16.747,66 €				15%	●	○
MEJ-21	2	2028	2025		19.535,21 €				10%	●	○
MEJ-24	2	2029-30	2025		445.274,35 €				0%	○	○
COR-03	3	2030	2030		66.296,47 €				0%	○	○
EYP-01	1	2032	2032		8.000,00 €		Revisión PGFS		0%	○	○
EYP-01	1	2032	2032		18.000,00 €		Revisión PGFS		0%	○	○
<b>TOTAL</b>					<b>4.831.089,50 €</b>				<b>21%</b>		

Firmado digitalmente por  
BARRANCO REYES JESUS -  
43818704 Fecha: 2022.05.31

